



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**OBRA:** MANTENIMIENTO CUBIERTAS

**INSTITUTO:** INSTITUTO DE FISICA DEL LITORAL

**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES**  
CONTRATACION DIRECTA N° 03/20 DOSC-DCU

**ARTICULO 1º: AUTORIDAD CONTRATANTE:**

La autoridad contratante para esta obra es la Universidad Nacional del Litoral, con domicilio legal en Bv. Pellegrini 2750.

**ARTICULO 2º: FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA:**

Las obras se licitan por el sistema de “**Ajuste Alzado**”, o sea por un monto único y global, vale decir por obra totalmente terminada, en un todo de acuerdo con los planos y pliegos que forman parte del legajo de licitación, incluido todo aquello que, sin estar expresamente indicado en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo, concluida con arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos.

El legajo respectivo puede ser adquirido en la Dirección de Construcciones Universitarias, hasta el penúltimo día hábil a la fecha de apertura.

Hasta dos (2) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura, la Dirección de Construcciones ([construcciones@unl.edu.ar](mailto:construcciones@unl.edu.ar)) evacuará las consultas administrativas y las consultas técnicas que formulen los interesados por escrito pidiendo aclaración o interpretación de algún punto o cuestión que estimaren dudosa. Las consultas y sus respuestas se comunicarán a todos quienes hubiesen adquirido legajos.

**ARTICULO 3º: CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS:**

**Sobre Documentación**

- 1) Pliego de bases de licitación y planos debidamente firmado en todas sus hojas.
- 2) Comprobante de garantía de Mantenimiento de Oferta, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del **PRESUPUESTO OFICIAL (\$ 5.656)**. Podrá ser de las siguientes formas, según lo establece el artículo 92º del Reglamento de Compras y Contrataciones:
  - a) en efectivo mediante depósito/transferencia bancaria en una cuenta de la UNL, en el Banco Credicoop Cuenta Corriente n° 191-340-597150/8 – Santa Fe – Prov. Santa Fe- CBU 19103406-55034059715082



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



- b) por seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la UNL.
- c) con pagaré a la vista con el correspondiente sellado bancario, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de \$48.000.
- La garantía de oferta deberá estar emitida a favor de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL con domicilio en Bv. Pellegrini 2750 – Santa Fe – Prov. Santa Fe., C.U.I.T. 30-54667055-0.
- 3) Recibo de adquisición del pliego.
- 4) Constancia de Habilidad (sin deuda) para contratar con el Estado Nacional. La misma se obtiene ingresando mediante Clave Fiscal a <https://auth.afip.gob.ar> y deberá imprimirse a partir de las 48 hs. anteriores a la fecha de apertura. La DCU - UNL verificará, de acuerdo a la Resolución General N° 4164 E/2017 – AFIP de fecha 01/12/2017, la existencia o no de incumplimientos ante la AFIP. No se requerirá su presentación para obras cuyo Presupuesto Oficial sea inferior a PESOS CINCUENTA MIL - \$ 50.000.
- 5) Se deberá acreditar la **pre-inscripción o inscripción** al Sistema de Información de Proveedores del Estado (**SIPRO**) (<https://comprar.gob.ar>);
- 6) Se deberá presentar **certificado en vigencia** del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (**IERIC**). Dicho certificado será en Original o Copia autenticada por Secretario de Juzgado o Escribano Público.
- No será condición excluyente la no presentación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, según lo establecido en el Art. 8° del PCG.
- 7) Constancias de Inscripción Nacionales, Provinciales o Municipales de Impuestos, régimen previsional, etc.
- 8) Copia autenticada por Secretario de Juzgado o Escribano Público del Contrato Social, si se trata de una sociedad según el - Art. 14° del PCG -
- 9) Referencias financieras y económicas - Art. 8° del PCG.
- 10) Referencias Técnicas - Art. 9° del PCG - y Declaración Jurada, según modelo ANEXO N° 1.

El no cumplimiento de presentación de los apartados 1 a 7, establecidas en el Sobre de Información Complementaria, dará motivo a la no apertura del Sobre Propuesta.

Si no se cumplimenta con la documentación requerida en los apartados 8, 9 y 10, los mismos deberán ser entregados a la Dirección de Construcciones dentro de las 48 hs. de realizado el acto de apertura

### **Sobre Propuesta Económica**

- 1) Propuesta por duplicado - Art. 13° del PCG - según modelo **ANEXO N° 2**;



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



- 2) Presupuesto discriminado por ítems - Art. 14° del PCG -
- 3) Análisis de precios - Art. 14° del PCG - de los ítems que componen el presupuesto, con el desglose del coeficiente resumen, según modelo **ANEXO N° 3**;
- 4) Plan de trabajos y curva de inversión - Art. 14° del PCG - según modelo **ANEXO N° 4**;

El no cumplimiento de toda la documentación solicitada en el sobre propuesta, dará motivo a la desestimación de la Oferta.

La Empresa al presentar su documentación, tanto en el Sobre Documentación como en el Sobre Propuesta Económica, deberá foliarla en forma correlativa, indicando la cantidad de folios que entrega en su oferta.

La Dirección de Construcciones podrá solicitar dentro de las 72 hs. de realizado el acto de apertura toda información que se considere necesaria.

#### **ARTICULO 4°: DOMICILIO DEL CONTRATISTA**

El Contratista deberá constituir domicilio físico legal en la Ciudad de Santa Fe. Así mismo deberá constituir un domicilio electrónico a donde será únicamente notificado de las resoluciones, comunicaciones y toda disposición que emita la universidad en relación a la contratación. Conforme a la Ordenanza N°6/19, la Empresa se considerará notificada desde la fecha de confirmación de la recepción del correo electrónico o en su caso desde el primer martes o viernes hábil subsiguiente a la emisión de la misma por parte de la universidad, lo que ocurra antes.

En caso de modificarse tanto el domicilio físico como el electrónico, el contratista está obligado a comunicar su nuevo domicilio al comitente, en el plazo de dos (2) días corridos, contado a partir de la modificación.

#### **ARTICULO 5°: DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS**

De acuerdo a las disposiciones vigentes, la Universidad se encuentra inscrita como agente de retención de los siguientes impuestos:

- Retenciones de Impuesto a las Ganancias-R.G (AFIP) 830 y Modific.
- Retenciones Impuesto al Valor Agregado-R.G. (AFIP) 18 y Modific.
- Recursos de la Seguridad Social-Régimen de Retención para Empresas Constructoras-R.G. (DGI) 4052 y Modific.
- Retenciones Impuesto sobre los Ingresos Brutos (AFIP) Res. N° 15/97 y 01/98 y Modific.

La Empresa Contratista deberá presentar ante la Dirección de Contabilidad previo a la liquidación y pago de cualquier certificado, fotocopia autenticada de las constancias de inscripción en los impuestos mencionados precedentemente.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ARTICULO 6º: MANTENIMIENTO DE OFERTA:**

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas - Art. 15º del PCG - en todos sus términos durante el plazo de **TREINTA (30) DÍAS HÁBILES** a partir de la fecha de licitación.

**ARTICULO 7º: DE LOS OFERENTES**

Los oferentes deben visitar la obra antes de formular su oferta a fin de interiorizarse de las condiciones de trabajo, estado de la obra, etc. No se admitirá por ningún motivo reclamos que se funden en falta de conocimiento o de información, deficiencia de la que se tenga o interpretación equivocada acerca del estado de la obra. Tampoco se podrá en ningún caso observar desconocimiento o mala interpretación de los planos, pliegos y/o demás elementos integrantes del legajo de licitación.

**ARTICULO 8º: PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo de ejecución se fija en **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS** desde el momento en que se otorgue la posesión del obrador.

**ARTICULO 9º: DEPOSITO DE GARANTÍA DE EJECUCION DE CONTRATO:**

Dentro del plazo de **DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS** de notificado; el adjudicatario deberá presentar un depósito de garantía, seguro de caución, del 5% del monto de su propuesta aceptada, para poder proceder a la firma del contrato, que se presentará en la Dirección de Construcciones Universitaria, según modelo **ANEXO N° 5**.

**ARTICULO 10º: FIRMA DEL CONTRATO:**

Dentro de los **DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS** de notificado, será firmado el contrato correspondiente entre la autoridad contratante y el adjudicatario, quién deberá proceder a su sellado pagando el 50% del valor. Dicho sellado deberá realizarse dentro de los **TRES (3) DIAS HÁBILES posteriores** a la entrega del contrato firmado.

**ARTICULO 11º: FORMA DE PAGO:**

**CERTIFICADO DE OBRA:** El último día hábil del mes, la Empresa ejecutará conjuntamente con la Inspección las mediciones correspondientes de la obra realizada y, ingresándolo mediante nota por mesa de entradas de la UNL, presentará por Mesada de Entradas de la UNL, en original y dos (2) copias, el Certificado de obra mensual para pagos mensuales de acuerdo al avance de la obra, de forma impresa según modelo **ANEXO N° 6**.

Del importe del certificado se deducirá un 5% en concepto de **fondo de reparos**, en garantía de la buena ejecución de los trabajos, el que se retendrá en efectivo o podrá ser avalado mediante Póliza de Seguro de Caución.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



Se establece como plazo de pago **TREINTA (30) DIAS CORRIDOS**, desde la fecha de ingreso del mismo a la U.N.L.; la Dirección de Construcciones procederá a revisarlo y aprobado que sea se elevará para su liquidación y pago.

La Empresa deberá presentar la siguiente documentación mensualmente junto con los certificados de obra:

- a) Listado del personal que trabaja en la obra y altas y bajas mensuales.
- b) Comprobantes de pago de todos los ítems del F. 931 AFIP-DGI y nómina de empleados con detalle de aportes y contribuciones del personal mencionado en el punto anterior.

En el caso que la empresa haya realizado convenios de pago se deberán presentar mensualmente los comprobantes de pago de todas las cuotas exigibles de los diferentes convenios.

- c) Comprobantes de pago cuota mensual de las Pólizas de Seguro de Incendio y Responsabilidad Civil.
- d) Certificado de Cobertura A.R.T. con listado del personal afiliado.
- e) Constancia de días de lluvia del mes certificado (<http://www.santa-fe.gov.ar/qbrn/regpluv/>).
- f) Copias de Constancias de Visitas a Obra del profesional matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo (mínimo 4).
- g) Informe Comparativo, con expresión gráfica, entre los avances físicos contractuales y el avance real cumplido en el mes. (considerando lo establecido en los Arts. 29 y 55 del P.C.G.).
- h) Nuevo plan de trabajos y curva de inversión cuando la Inspección lo solicite por incumplimientos en el plan de obra.

**NOTA: SE DEJA ACLARADO QUE TODA LA DOCUMENTACION EXIGIDA SE DEBERÁ PRESENTAR INDEFECTIBLEMENTE, TODOS LOS MESES ACTUALIZADA, JUNTO CON LOS CERTIFICADOS DE OBRAS MENSUALES PARA PROCEDER A SU APROBACION, TRAMITACION Y PAGO.**

#### **ARTICULO 12º: ACTA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Dentro de los **DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS** a la firma del contrato se labrará un acta de iniciación de los trabajos a partir de cuya fecha comenzará a correr el plazo de ejecución.

Antes del inicio de la obra la empresa deberá cumplimentar con la entrega de toda la documentación requerida en pliegos, CASO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR INICIO A LOS TRABAJOS con las sanciones correspondientes, según modelo **ANEXO N° 7**.

La percepción del certificado de Anticipo Financiero no será impedimento para el inicio de la obra dentro del plazo establecido.

#### **ARTICULO 13º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:**

Para las obras cuyo Plazo de Ejecución no supere los **SETENTA Y CINCO (75) días corridos**, no podrán solicitarse Redeterminaciones del Monto de Contrato.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



#### **ARTICULO 14°: ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA:**

Una vez concluido el plazo de obra la Empresa deberá solicitar la Recepción Provisoria y, cuando correspondiere la devolución de la Póliza de Seguro de Caución presentada en Garantía de Anticipo Financiero, mediante presentación de nota en la oficina de la DCU, dirigida a su Director, según modelo **ANEXO 11**.

Una vez concluido el plazo de garantía la Empresa deberá solicitar la Recepción Definitiva y la devolución, mediante presentación de nota (**ANEXO 11**) en la oficina de la DCU dirigida a su Director, de:

- Póliza de Seguro de Caución presentada como Garantía de Ejecución de Contrato.
- Póliza de Seguro de Caución presentada en Sustitución de Fondo de Reparos.

La primera acta (Recepción Provisoria) se labrará contra entrega de conformidad de los trabajos y previo al pago del certificado final de obra. La segunda (Recepción Definitiva) se labrará una vez transcurrido el plazo de garantía, tras la cual y de no existir observaciones a corregir se procederá a la devolución de las Garantías.

#### **ARTICULO 15°: PLAZO DE GARANTÍA:**

Será de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS** plazo durante el cual, de surgir alguna deficiencia no atribuible al mal uso, el adjudicatario deberá proceder a su corrección, modificación o cambio. Si así no lo hiciera la autoridad contratante podrá ordenar dicha corrección con terceros y con cargo al Fondo de Reparos.

#### **ARTICULO 16°: MULTAS:**

Por demora en la entrega de los trabajos, el contratista se hará pasible de una multa calculada mediante la siguiente fórmula:

$$M = 0.10 (C/P)$$

M = Multa de aplicar por cada día corrido de demora

C = Monto de Contrato

P = Plazo de ejecución expresado en días corridos

#### **PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN:**

Producido el caso de aplicación de multas, incluidas en el Art. 96 del Pliego de Condiciones Generales, la Inspección establecerá el monto correspondiente e informará el hecho a la Dirección, quién dará vistas a la Contratista a los fines de su conocimiento y descargo.

#### **ARTICULO 17°: AGUA DE CONSTRUCCIÓN:**

El agua que demande la construcción, será provista por el comitente, debiendo el contratista tener los elementos de almacenaje.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



#### **ARTICULO 18º: ENERGIA ELECTRICA:**

El comitente proveerá energía eléctrica necesaria desde el tablero más próximo, debiendo el contratista conducirla hasta el obrador.

#### **ARTICULO 19º: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

Las empresas contratistas deberán dar cumplimiento a las normas vigentes en el orden nacional. Respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo - Ley 19587-24557-22250-Dcto. 351/71-911/96 -, y dispondrá los medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la obra, teniendo especial cuidado en aquellas que se realicen en establecimientos Educativos y en período lectivo.

Las Empresas deberán presentar una “Declaración Jurada” donde se deje constancia que cuentan con los “Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 231/96; Decreto 911/96, firmada por el Representante Técnico de la Empresa y un Profesional Matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, interno o externo a la Empresa, según **ANEXO Nº 8**.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación:

El Contrato de Riesgos de Trabajo correspondiente a la obra de referencia que cubra los riesgos del personal afectado, tanto Administrativo como Operarios y Obreros, sea personal contratado por el adjudicatario o personal dependiente de la D.C.U. que se preste funciones en la obra, emitida por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) o comprobantes de autoseguro (Ley 24557), con cláusula de “no repetición”, según **ANEXO Nº 9**.

EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, (en concordancia con el Art. 20 del Dcto. 911/96 51, 318 y Res. SRT 051/97, Anexo 1) aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria presentará mensualmente, acompañando el certificado de obra ejecutada:

Certificado de cobertura actualizado emitido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) con la nómina detallada del personal afectado a obra.

Entregará copias y las constancias de visita a la obra del Profesional Matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Si no cumplimenta con este requisito la Inspección no podrá dar curso al Certificado de Obra.

LA INSPECCIÓN DE OBRA EXIGIRÁ LA DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN PLIEGOS POR LA DCU ANTES DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS Y/ O EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS, PARA SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE OBRA.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ARTICULO 20°: PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE INVERSIONES Y ANALISIS DE PRECIOS:**

Antes de comenzar los trabajos, la Empresa deberá presentar las correcciones que en su momento fueran solicitadas por la Dirección de Construcciones, del Plan de Trabajos, Curva de Inversiones y Análisis de Precios.

**ARTICULO 21°: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO:**

Teniendo en cuenta lo determinado en el Art. 12° del Pliego de Condiciones Generales, respecto al valor del cómputo métrico y presupuesto oficial, la Empresa deberá realizar y presentar en su propuesta, su propio cómputo y presupuesto, de acuerdo al ordenamiento de ítems oficiales. A los fines de la Certificación mensual, se adoptarán el cómputo métrico y el presupuesto fijados por la Empresa, como así también para el caso de trabajos adicionales que se soliciten durante el transcurso de la obra.

**ARTICULO 22°: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

El Oferente deberá presentar según el Art. 3° el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES y EQUIPOS de los PRECIOS UNITARIOS, según los modelos adjuntos en el **ANEXO 3**, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el Art. 4° de este Pliego.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece ANEXO 3, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato.

**ARTICULO 23°: CARTEL DE OBRA:**

El Contratista proveerá un cartel de obra de **2x1 METROS** en chapa pintada fondo blanco con letras negras y su correspondiente estructura de sostén. El texto del cartel será dado oportunamente por la Dirección de Construcciones Universitarias.

**ARTICULO 24°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN:**

La Empresa pondrá a disposición de la Inspección un medio de movilidad con chofer en horario matutino para su traslado a obra o cualquier otro destino que tenga relación con la misma.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



#### **ARTICULO 25°: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN:**

La Inspección de Obra deberá tener un Local Oficina, de como mínimo 10 m<sup>2</sup> de superficie, 2,5 m. de altura y contará con luz eléctrica. Se proveerá de un escritorio con sillas, repisas o armario: deberá tener buena ventilación y seguridad mediante la colocación de rejas de hierro en las ventanas y llave de seguridad en la puerta. Los muros permitirán tener paneles o soportes de la planimetría.

#### **ARTICULO 26°: REVISIÓN DE TRABAJOS ANTES DE TAPAR, AMURAR O RELLENAR:**

El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la Inspección y avisará con tiempo para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o material. En caso de infracción a esta norma, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuere necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista exclusivamente.

#### **ARTICULO 27°: PLANOS CONFORME A OBRA:**

**1.- Instalaciones Sanitarias, Cloacales y Pluviales:** Una vez realizadas las pruebas de hermeticidades requeridas y verificadas por la Inspección de Obra y antes de amurar, sellar o tapar las cañerías correspondientes a cada servicio, la Empresa deberá presentar OBLIGATORIAMENTE, la planimetría correspondiente, en escala adecuada y en papel original, 2 copias en papel blanco y en soporte digital.

**2.- Instalaciones de Gas Natural:** Una vez realizada la prueba de hermeticidad y aprobada la distribución de las cañerías por Litoral Gas S.A., la Empresa presentará OBLIGATORIAMENTE, antes de amurar, sellar o tapar, la planimetría correspondiente en escala adecuada y en papel original, 2 copias en papel blanco y en soporte digital. Independientemente de la planimetría y formularios, que deberán estar aprobados por Litoral Gas S.A.

**3.-Obra Civil:** La contratista deberá Presentar OBLIGATORIAMENTE 15 días antes de la solicitud de la Recepción Provisoria, los Planos Originales Conforme a Obra, en papel original, 2 copias en papel blanco y en formato digital.

En todos los casos, no se dará curso al certificado de obra mensual, si la Empresa no cumpliera con la presente disposición.

#### **ARTICULO 28°: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE O CONDUCTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA EN LA OBRA:**

Se deberá presentar ante la Dirección de Construcciones y previo al inicio de obra, según **ANEXO Nº 10**, el REPRESENTANTE / CONDUCTOR TÉCNICO EN LA OBRA:

a) debe tener título profesional con incumbencias en obras de Arquitectura, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes. Para la presente obra se exigirá como mínimo el título de Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones– Técnico Constructor Nacional – Maestro Mayor de Obras



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



- b) debe tener la Matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo
- c) se deberán presentar los comprobantes de pagos de la totalidad (100%) de los aportes profesionales del profesional interviniente, tomando como base el monto de contrato para la liquidación de los mismos.

**ARTICULO 29º: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES PROVINCIALES DE COLEGIACIÓN  
INDEPENDIENTE Y APORTES PREVISIONALES**

Previo al inicio del replanteo de la obra y en tiempo de la designación del Director Técnico de la Contratista, como de su Conductor Técnico, se deberán elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales y de todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas.

Si el Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento.

**ARTICULO 30º: SEGUROS:**

A) DAÑOS A TERCEROS: El contratista deberá contar con la cobertura de un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000). Éste deberá estar a su nombre y el del Comitente, manteniendo cubierto a éste por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que pudieran producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras, y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. El Comitente deberá ser incluido como co-asegurado, acreedor hipotecario o figura similar, que le permita litigar en la ejecución de la póliza.

B) INCENDIOS: El Contratista deberá asegurar la obra contra incendios y otros riesgos materiales, debiendo tener la cobertura un valor que en todo momento cubra el total certificado. El Comitente deberá ser incluido como co-asegurado, acreedor hipotecario o figura similar, que le permita litigar en la ejecución de la póliza.

Todas las pólizas de seguros, o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente el que dará su aprobación antes de iniciarse las obras, de lo contrario no se procederá al inicio de la misma, como tampoco se realizará ningún pago por concepto alguno al Contratista. Estas coberturas deberán mantenerse vigentes hasta la Recepción Provisoria de la Obra. El Contratista será responsable civil y administrativamente por los daños y perjuicios emergentes de la falta de coberturas.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



### **ARTICULO 31: RESPONSABILIDAD POR OBRAS SUBCONTRATADAS**

El contratista podrá subcontratar la ejecución de una parte de la obra objeto de contrato sólo con autorización del Comitente, sin que esto lo exima de sus obligaciones y responsabilidades como contratista principal, según lo establece el Art.26 del PCG. En este caso, se deberá presentar la documentación que acredite formalmente la relación contractual entre contratista principal y subcontratado quien deberá cumplir con las mismas obligaciones exigidas en pliego:

- Copia del Contrato respectivo de subcontratación y su constancia de pago;
- Constancia que acredite la situación fiscal, impositiva y previsional del subcontratista;
- Nómina del personal que trabajan o prestan servicios en la obra, exigiéndoles a todas ellas la misma documental que se exige respecto a los empleados del contratista; y
- Para el supuesto que el subcontratista preste servicio de manera personal (sin utilizar empleados), deberá acompañar la póliza de un seguro personal.

Toda esta documentación deberá presentarse antes del inicio de obra, y será controlado su cumplimiento mensualmente en cada certificación.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ANEXO Nº 1**

**OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA**

| Nº  | COMITENTE           | OBRA (1)            |  |      |         |                        |                             |                               |
|-----|---------------------|---------------------|--|------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|     | NOMBRE<br>DOMICILIO | NOMBRE<br>UBICACION | DATOS<br>CONTRACTUALES<br>FECHA INICIO    FECHA<br>TERM- | SUP. | VOLUMEN | CANTIDAD<br>DE NIVELES | MONTO DE<br>CONTRATO<br>(2) | PORCENTAJE    DE<br>DE AVANCE |
| (3) |                     |                     |  |      |         |                        |                             |                               |
|     |                     |                     |  |      |         |                        |                             |                               |

**OTRAS OBRAS REALIZADAS**

| Nº  | COMITENTE           | OBRA (1)            |   |      |         |                        |                             |                         |
|-----|---------------------|---------------------|---|------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|     | NOMBRE<br>DOMICILIO | NOMBRE<br>UBICACION | DATOS CONTRACTUALES<br>FECHA INICIO    FECHA<br>TERM- | SUP. | VOLUMEN | CANTIDAD<br>DE NIVELES | MONTO DE<br>CONTRATO<br>(2) | PORCENTAJE<br>DE AVANCE |
| (4) |                     |                     |   |      |         |                        |                             |                         |
|     |                     |                     |   |      |         |                        |                             |                         |

**NOTAS IMPORTANTES**

- (1) Las obras que se detallan no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, al momento de la Licitación, contados desde la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del Comitente, deberá acompañar su acreditación.
- (2) El Monto de Obra se consignará a valores de contrato.
- (3) Declarar una sola planilla, aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociación corresponde la obra.
- (4) El Oferente podrá declarar otras obras, que, aunque no cumplan con las exigencias de "obras análogas" permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias técnicas generales.

Para las formalidades de presentación y acreditación valen las Notas 1, 2 y 3 expresadas más arriba.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



LISTA DE EQUIPO PROPUESTO PARA UTILIZAR EN LA OBRA

| Nº  | CANTIDAD | DESCRIPCION Y CAPACIDAD | MARCA | MODELO | FECHA INCORPORACION | PROPIO O ALQUILADO | OBS. |
|-----|----------|-------------------------|-------|--------|---------------------|--------------------|------|
| (1) |          |                         |       |        |                     |                    |      |
|     |          |                         |       |        |                     |                    |      |
|     |          |                         |       |        |                     |                    |      |
|     |          |                         |       |        |                     |                    |      |

NOTA IMPORTANTE

- (1) Declarar una sola planilla, aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociación corresponde el Equipo.

Santa Fe, .....

.....  
Firma y Sello del Proponente

.....  
Firma y Sello del Director Técnico



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



DECLARACION JURADA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° .....

OBRA: .....

OFERENTE: .....

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores no homologado, ni quiebra, como así también fuero en su contra por la Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha provincia, ni que la Provincia hubiera formulado denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o cualquier contrato administrativo suscripto con esos entes.

Igualmente declaran, los socios que integran la empresa oferente, no estar inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Ley N° 11945, adjuntándose certificado negativo de inscripción en el mencionado Registro.

Asimismo, se declara que por cualquier cuestión judicial que se suscite, las partes se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva del Juzgado Federal de la Ciudad de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

Por otra parte, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las condiciones en que se ejecutará la misma y nos comprometemos a disponer en forma inmediata a la fecha de la firma del contrato, el equipamiento ofrecido según Anexo 3.

.....

Firma y aclaración  
Del Oferente

.....

Firma y Aclaración  
del Director Técnico

Lugar y fecha .....



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ANEXO Nº 2**

FORMULARIO PROPUESTA (Nº ----)

Santa Fe, .....de.....de 2020

Sr. ....

Su despacho

Ref.: Contratación Directa para la ejecución de la Obra

De nuestra consideración:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente .....  
respectivamente, de la Empresa ..... inscrita en .....  
cotizan precio de ejecución de los trabajos indicados en la documentación correspondiente.

a) El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,  
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: \$..... (en números)  
.....(en letras) que supone un aumento y/o disminución del  
..... % (en letras) del presupuesto oficial.

b) Además de la oferta precedente y por separado, proponemos la siguiente  
alternativa:.....

c) A fin de cumplimentar con lo indicado en el Art. 3 del Pliego de Condiciones

Particulares, acompañamos la siguiente documentación:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....
- 7 .....
- 8 .....
- 9 .....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



14.....

Al efecto, se constituyen domicilio físico especial en ..... de la ciudad de Santa Fe, provincia del mismo nombre; y domicilio electrónico en la siguiente dirección .....

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, Art. 9, es de treinta (30) días hábiles; y además declaramos conocer las condiciones de la obra.

La Empresa declara haber visitado el sitio donde se llevará a cabo la obra de referencia, tomando conocimiento de las condiciones y estado del lugar para poder realizar la propuesta.

Saludamos con atenta consideración.

.....

Director Técnico

.....

Proponente

Sello de la Empresa

**NOTA IMPORTANTE:** Se aclara a los Proponentes que para que sean tenidas en cuenta las ofertas variantes formuladas en el inc. b), es condición indispensable que se cotice precio por inc. a).



2020

Año del General  
Manuel Belgrano



### ANEXO N° 3

Modelo estructura de costo de los ítems del presupuesto

| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                |          |                  |                 |                                  |
|--|----------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Items : 3.1 ESTRUCTURAS - VIGAS DE FUNDACION H°A° H21</b> |          |                  |                 |                                  |
| DESCRIPCION  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | COSTO BASE FEB-17                |
| <b>MATERIALES</b>  |          |                  |                 |                                  |
| hormigon elaborado H21                                       | 1,02     | m3               | \$ 902,15       | \$ 920,19                        |
| acero  | 156,00   | kg               | \$ 7,78         | \$ 1.213,12                      |
| alambre  | 1,56     | kg               | \$ 14,20        | \$ 22,15                         |
| madera   | 2,72     | m2               | \$ 120,14       | \$ 326,78                        |
| clavos   | 2,33     | kg               | \$ 14,74        | \$ 34,35                         |
| <b>SUB-TOTAL MATERIALES ( A )</b>                            |          |                  |                 | <b>\$ 2.516,59</b>               |
| <b>MANO DE OBRA</b>  |          |                  |                 |                                  |
| oficial  | 13,24    | hs               | \$ 54,75        | \$ 725,05                        |
| ayudante   | 22,74    | hs               | \$ 46,36        | \$ 1.054,05                      |
| <b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA ( B )</b>                          |          |                  |                 | <b>\$ 1.779,10</b>               |
| <b>EQUIPOS</b>   |          |                  |                 |                                  |
| HERRAMIENTAS VARIAS  | 1,00     | gl               | \$ 57,55        | \$ 57,55                         |
| <b>SUB-TOTAL EQUIPOS ( C )</b>                               |          |                  |                 | <b>\$ 57,55</b>                  |
| <b>COSTO NETO TOTAL ( D )</b>                                |          |                  |                 | <b>( A + B + C ) \$ 4.353,24</b> |
| <b>PRECIO DEL ÍTEM: COSTO NETO TOTAL ( D ) x C.R.</b>        |          |                  |                 | <b>1,6559 \$ 2.855,29</b>        |
| <b>PRECIO DEL ÍTEM</b>                                       |          |                  |                 | <b>\$ 7.208,52</b>               |
| Valores de carácter informativo                              |          |                  |                 |                                  |

#### COEFICIENTE DE RESUMEN:

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios

COSTO NETO = 1,000

+

Gastos Generales e Indirectos (...% de 1,000) = .....

+

Beneficios (...% de 1,000) = .....

..... (a)

A.P.I. – I.I.B. = ...%de (a) ..... (b)

D.G.I. – I.V.A. = ...% de [(a)+(b)] .....(c)

COEFICIENTE RESUMEN (CR) = (a+b+c) = .....



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano




**ANEXO Nº 4**

**PLAN DE TRABAJOS FISICO**

| Nº<br>RUBRO/<br>ITEM | DESCRIPCION DE LA<br>ACTIVIDAD – TRABAJO | % INCID |   |   |   |   |  |     |               |
|----------------------|--|---------|---|---|---|---|--|-----|---------------|
|                      |  |         | 1 | 2 | 3 | 4 |  |     |               |
|                      |  |         |   |   |   |   |  |     |               |
|                      |  |         |   |   |   |   |  |     |               |
|                      |  |         |   |   |   |   |  |     |               |
|                      |  |         |   |   |   |   |  |     |               |
|                      |  |         |   |   |   |   |  |     |               |
|                      | INVERSION MENSUAL                        | %       |   |   |   |   |  |     |               |
|                      | INVERSION ACUMULADA                      | %       |   |   |   |   |  |     |               |
|                      | INVERSION MENSUAL                        | \$      |   |   |   |   |  |     |               |
|                      | INVERSION ACUMULADA                      | \$      |   |   |   |   |  | 100 | MONTO<br>OBRA |

**CURVA DE INVERSIONES**

INVERS. (%)

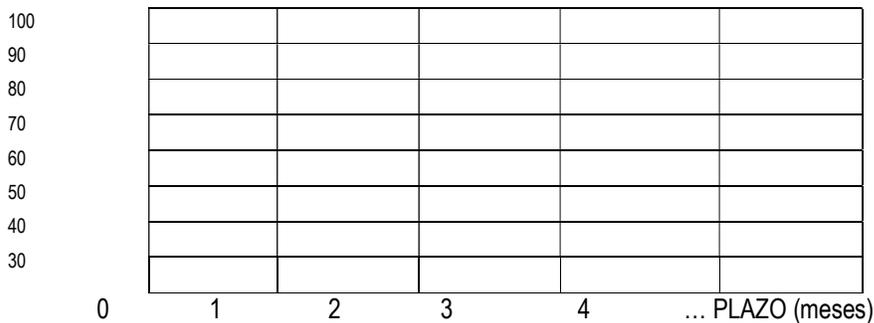

**NOTAS IMPORTANTES:**

- El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminado por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.
- La Curva de Inversiones se presentará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ANEXO N° 5**

Señor  
Director de Construcciones Universitarias  
San Jerónimo 3575  
3000-SANTA FE

REF: CONTRATACION DIRECTA N°.....  
OBRA: .....  
EXPEDIENTE N°.....  
EMPRESA:.....  
-----

Me dirijo a usted a fines de elevar a su consideración, Póliza N° ..... de Seguro de Caucción de la Cía..... en Garantía de Ejecución de Contrato correspondiente a la obra de la referencia, por un monto de \$.....

Atte.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ANEXO Nº 7**

**MODELO DE NOTA DE PRESENTACIÓN CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL**

SANTA FE, .....

Señor Rector de la  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  
Bv. Pellegrini 2750 - SANTA FE

REF: OBRA: .....  
INSTITUTO- FACULTAD:.....  
EXpte. Nº.....  
EMPRESA:.....  
-----

Me dirijo a usted en nombre y representación de la Empresa ....., a los efectos de elevarle la documentación que más abajo se detalla.

- **Certificado de Obra Nº**.....(original, duplicado y triplicado) correspondiente a la obra de referencia.
- Listado del personal que trabaja en la obra y altas y bajas mensuales.
- Comprobantes de pago de todos los ítems del F. 931 AFIP-DGI y nómina de empleados con detalle de aportes y contribuciones del personal mencionado en el punto anterior.  
En el caso que la empresa haya realizado convenios de pago se deberán presentar mensualmente los comprobantes de pago de todas las cuotas exigibles de los diferentes convenios.
- Comprobantes de pago cuota mensual de las Pólizas de Seguro de Incendio y Responsabilidad Civil.
- Certificado de Cobertura A.R.T. con listado del personal afiliado.
- Constancia de días de lluvia del mes certificado.
- Copias de Constancias de Visitas a Obra del profesional matriculado en Higiene y Seguridad en el Trabajo (mínimo 4).
- Informe Comparativo, con expresión gráfica, entre los avances físicos contractuales y el avance real cumplido en el mes. (considerando lo establecido en los Arts. 29 y 55 del P.C.G.).
- Nuevo plan de trabajos y curva de inversión cuando la Inspección lo solicite por incumplimientos en el plan de obra.

Atte.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



MODELO DE RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL**  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS CENTRALIZADOS  
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>EMPRESA:</b>              |  |
| <b>OBRA:</b>                 |  |
| <b>INSTITUTO O FACULTAD:</b> |  |
| <b>EXPEDIENTE N°:</b>        |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>CONTRATISTA:</b> |  |
| <b>DOMICILIO:</b>   |  |
| <b>TELEFONO/FAX</b> |  |
| <b>C.U.I.T.</b>     |  |

|                             |  |                      |  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|
| <b>RES. DE ADJUDIC. N°</b>  |  | <b>FECHA</b>         |  |
| <b>FECHA DE CONTRATO:</b>   |  |                      |  |
| <b>MONTO CONTRACTUAL:</b>   |  |                      |  |
| <b>ANTICIPO FINANCIERO:</b> |  |                      |  |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>  |  | <b>DIAS CORRIDOS</b> |  |

**CERTIFICADO DE OBRA N°**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| TOTAL CERTIFICADO A LA FECHA (\$): | \$ 800.640,21 |
|------------------------------------|---------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| AVANCE DE OBRA TOTAL (%): | #N/D |
|---------------------------|------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| TOTAL CERTIFICADO AL MES ANTERIOR: | \$ 239.730,69 |
|------------------------------------|---------------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| AVANCE DE OBRA AL MES ANTERIOR (%) | #N/D |
|------------------------------------|------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| CERTIFICADO DEL MES (\$): | \$ 560.909,52 |
|---------------------------|---------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| AVANCE MENSUAL (%): | #N/D |
|---------------------|------|

|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| A DEDUCIR POR ANTICIPO FINANCIERO | 20% | \$ 112.181,90 |
|-----------------------------------|-----|---------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| TOTAL : | \$ 448.727,62 |
|---------|---------------|

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| A DEDUCIR POR FONDO DE REPARO (sustituído con Póliza de Caucción) (1): | 5% | \$ 28.045,48 |
|--|----|--------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR POR PERIODO CERTIFICADO | \$ 420.682,14 |
|---------------------------------------|---------------|

**SON PESOS (EN LETRAS):**

Referencias:      Celda con datos a cargar por la empresa.  
     Celda con formulas automaticas.

(1) Si presenta sustitucion por garantia, no se descuenta y se deja aclarado.



MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA

| COMPUTO Y PRESUPUESTO               |  |                  |          |                 |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 3 |                      |        |                        |        |                    |                      |                     |
|-------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------|--|--------------------------|----------------------|--------|------------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------------|
| N° ITEM                             | DESCRIPCION DEL ITEM                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL                             | % INICIO                 | CANTIDAD CERTIFICADA |        | PORCENTAJE CERTIFICADO |        | MONTOS CERTIFICADO |                      |                     |
|                                     |  |                  |          |                 |  |                          | ANTERIOR             | ACTUAL | ANTERIOR               | ACTUAL | ANTERIOR           | ACTUAL               |                     |
| <b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>      |  |                  |          |                 |  |                          |                      |        |                        |        |                    |                      |                     |
| 1.01                                | Limpieza inicial, periódica y final de obra                | GL               | 1,00     | \$ 24.484,36    | \$ 24.484,36                             | 7,39%                    | 0,80                 | 0,10   | 0,70                   | 89%    | 10%                | \$ 14.690,62         | \$ 2.448,44         |
| 1.02                                | Cerco de obra  | GL               | 1,00     | \$ 3.038,27     | \$ 3.038,27                              | 0,91%                    | 1,00                 | 1,00   | 1,00                   | 100%   | 100%               | \$ 3.038,27          | \$ 3.038,27         |
| 1.03                                | Cerco de obra  | ML               | 30,00    | \$ 718,90       | \$ 21.566,90                             | 6,48%                    | 30,00                | 30,00  | 30,00                  | 100%   | 100%               | \$ 21.566,90         | \$ 21.566,90        |
| 1.04                                | Preliminares varios  | GL               | 1,00     | \$ 10.504,55    | \$ 10.504,55                             | 3,16%                    | 1,00                 | 1,00   | 1,00                   | 100%   | 100%               | \$ 10.504,55         | \$ 10.504,55        |
| <b>2 MAMPOSTERIAS Y TABICUERIAS</b> |  |                  |          |                 |  |                          |                      |        |                        |        |                    |                      |                     |
| 2.01                                | Mampostería de ladrillos comunes esp=15cm                  | M3               | 9,71     | \$ 4.782,09     | \$ 46.424,12                             | 13,95%                   | 3,88                 | 2,43   | 6,31                   | 40%    | 25%                | \$ 18.573,65         | \$ 11.808,53        |
| 2.02                                | Mampostería de ladrillos cerámicos esp. 0,20               | M2               | 36,13    | \$ 735,87       | \$ 26.597,02                             | 7,99%                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0%     | 0%                 | \$ -                 | \$ -                |
| <b>3 AISLACIONES</b>                |  |                  |          |                 |  |                          |                      |        |                        |        |                    |                      |                     |
| 3.01                                | Capa aisladora horizontal en muros/ otros                  | M2               | 3,85     | \$ 186,51       | \$ 718,07                                | 0,22%                    | 3,85                 | 3,85   | 3,85                   | 100%   | 100%               | \$ 718,07            | \$ 718,07           |
| 3.02                                | Capa aisladora vertical en muros/ otros                    | M2               | 5,65     | \$ 159,27       | \$ 899,89                                | 0,27%                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0%     | 0%                 | \$ -                 | \$ -                |
| 3.03                                | Pintura asfáltica sobre paramentos horizontales/verticales | M2               | 241,22   | \$ 84,31        | \$ 20.395,72                             | 6,11%                    | 96,49                | 36,18  | 132,67                 | 40%    | 15%                | \$ 8.134,69          | \$ 3.050,51         |
| <b>4 REPOQUES</b>                   |  |                  |          |                 |  |                          |                      |        |                        |        |                    |                      |                     |
| 4.01                                | Fino   | M2               | 75,00    | \$ 152,79       | \$ 11.459,48                             | 3,44%                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0%     | 0%                 | \$ -                 | \$ -                |
| 4.02                                | Impresible   | M2               | 300,82   | \$ 156,31       | \$ 46.890,23                             | 14,12%                   | 120,25               | 45,09  | 165,34                 | 40%    | 15%                | \$ 18.796,09         | \$ 7.048,53         |
| 4.03                                | Grueso   | M2               | 75,00    | \$ 251,67       | \$ 18.875,43                             | 5,67%                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0%     | 0%                 | \$ -                 | \$ -                |
| 4.04                                | Exterior Revestimiento Plastico                            | M2               | 59,41    | \$ 572,70       | \$ 34.023,88                             | 10,22%                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                   | 0%     | 0%                 | \$ -                 | \$ -                |
| 4.05                                | Tornado de junta de ladrillos vistos                       | M2               | 217,01   | \$ 308,01       | \$ 66.842,11                             | 20,09%                   | 88,90                | 32,55  | 119,36                 | 40%    | 15%                | \$ 26.736,84         | \$ 10.026,32        |
|                                     |  |                  |          |                 | <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>\$ 332.761,02</b>     | <b>100,00%</b>       |        |                        |        |                    | <b>\$ 122.759,68</b> | <b>\$ 34.182,32</b> |
|                                     |  |                  |          |                 | <b>TOTAL CERTIFICADO DE OBRA N° 3</b>    |                          |                      |        |                        |        |                    | <b>\$ 34.182,32</b>  |                     |
|                                     |  |                  |          |                 | <b>DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO 25%</b> |                          |                      |        |                        |        |                    | <b>\$ 8.545,58</b>   |                     |
|                                     |  |                  |          |                 | <b>SUB-TOTAL</b>                         |                          |                      |        |                        |        |                    | <b>\$ 25.636,73</b>  |                     |

Valores con carácter informativo



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ANEXO N° 8**

**MODELO DE NOTA DE PRESENTACION PEDIDO INICIO DE OBRA**

Señor

Director de Construcciones Universitarias

San Jerónimo 3575

3000-SANTA FE

REF: CONTRATACION DIRECTA N° .....

OBRA:.....

EXPEDIENTE N° .....

EMPRESA:.....

Me dirijo a usted a fines de elevar a su consideración, la siguiente documentación requerida para dar inicio a las obras:

(5) PÓLIZAS DE SEGURO

- INCENDIO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA
- RESPONSABILIDAD CIVIL

(6) Declaración Jurada-Servicio Higiene y Seguridad en el Trabajo (art. 18 P.C.C) y Programa Único de Seguridad para la actividad en obra (art. 18 P.C.C.).

(7) Contrato A.R.T. (Art18 P.C.C.)

(8) Listado Personal afiliado A.R.T..

(9) Constancias de aportes de profesionales intervinientes, según pliego

Atte.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ANEXO Nº 9**

**RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (\*)**

Apellido y Nombre .....

Documento de Identidad (Tipo y No.) .....

Título: ..... Universidad: .....

Especialización: ..... Institución: .....

Matrícula Nº ..... Colegio: ..... Distrito .....

Fecha de Inscripción ..... Categoría: .....

Antecedentes: (1) .....

(1) Consignar Datos en Planilla:

| Obra                           | Tipo Obra/Trabajo/Plazo de Tarea / Rol cumplido | Fechas          | Desempeño |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Nombre / Ubicación / ejecución | ( breve descripción)                            | (desde / hasta) | .....     |

Comitente descripción  
.....

Deberá agregarse *Curriculum Vitae*

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..... de ..... de 2020.

.....  
Firma y Sello del Proponente

.....  
Firma y Sello del Director Técnico

**Notas:** Deberá agregarse a la presente la **Certificación del Colegio Profesional** correspondiente.



**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



## ANEXO N° 10

### **Cláusulas de No Repetición de la ART contra el Comitente.**

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente oportunamente la contratista.

“(Indicar Nombre de la A.R.T) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra el Comitente, sus funciones, empleados y obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. (Indicar Nombre de la A.R.T) A.R.T. me obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurador, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificados”.





**2020**

Año del General  
Manuel Belgrano



**ANEXO N° 12**

Señor Director de  
Construcciones Universitarias

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N°.....

OBRA:.....

EXPEDIENTE N°.....

EMPRESA:.....

-----

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar la Recepción Provisoria y/o Recepción Definitiva (según corresponda) de la Obra de referencia.

De igual modo se solicita la devolución de las pólizas correspondientes a esta instancia.

Atte.
